

FPT • CHƯƠNG TRÌNH AIX

AI Native cho FA

Khung kế hoạch ứng dụng AI tới hết 2026

Mục tiêu đo được theo chuẩn **6 Rõ** • Bản nháp để review khung • 07/2026

Đang ở đâu và cần làm gì cho FA

ĐÃ CÓ MỘT PHẦN

Người & Năng lực

Chương trình đào tạo / chuyển đổi con người cho FA đã được xây và triển khai.

VỪA NHẬN

Mandate AIX

Chính thức phụ trách chuyển đổi AI (AIX) cho FA — mở rộng từ người sang delivery & khách hàng.

CẦN LÀM

Plan tới hết 2026

Ứng dụng AI cho dự án và khách hàng, với outcome business đo được rõ ràng.

Thước đo xuyên suốt: mọi sáng kiến phải đạt chuẩn 6 Rõ của FPT — rõ bài toán, nhiệm vụ, thời hạn, kết quả, người phụ trách, ngân sách.

6 Rõ — thước đo mọi sáng kiến AIX

1

Rõ bài toán lớn

Đích đến mô tả rõ, lượng hoá dưới dạng chỉ tiêu cam kết.

2

Rõ nhiệm vụ

Chia nhỏ thành đầu việc / chỉ số theo dõi tháng-tuần.

3

Rõ thời hạn

Mốc Ngày/Tháng cụ thể + tần suất báo cáo, review.

4

Rõ kết quả đầu ra

Tiêu chí tính & cách đánh giá, align với bài toán lớn.

5

Rõ người phụ trách

Owner đủ năng lực, đủ thẩm quyền cho từng sáng kiến.

6

Rõ ngân sách

Chi phí tool/license + nhân sự chuyên môn.

3 trụ ứng dụng AI + nền quản trị

A AI cho Delivery

AI-in • nội bộ

Tăng năng suất cách FA làm dự án:
code, test, review, tài liệu, PM.

→ Margin ↑

B AI cho Khách hàng

AI-out • doanh thu

AI thành sản phẩm/offering bán
được, nhúng vào giải pháp cho KH.

→ Win rate ↑

C AI cho Con người

Enable • đã có chương trình

Năng lực & thói quen dùng AI: đào
tạo, chứng chỉ, cộng đồng.

→ Nền cho A & B

Nền — Governance: policy tool/IP/security • cách đo & dashboard • ngân sách. Trọng tâm 6 tháng: dồn vào A và B (chỗ tạo con số business).

NỀN ĐÃ CÓ

Trụ C — AI cho Con người: chương trình đang chạy

Không bắt đầu từ số 0 — lực lượng vận hành cho Trụ A & B đã được đào tạo (bộ PM-AI-Bootcamp).

200-300

PM tham gia toàn FA

4

track · PM BA SA Dev

~9 tuần

3 giai đoạn · học lồng 30-40%

4 wave

~75 PM mỗi wave

LỘ TRÌNH HỌC — 3 PHASE

Phase 1 · AI Mindset · 1 ngày tự đánh giá CASAN + chọn dự án pilot

↓

Phase 2 · Hands-on · 4 tuần 10 bài tập (T1-T10) đều có telemetry

↓

Phase 3 · Capstone · 4 tuần làm “Customer Zero” chạy được + vấn đáp (viva)

3 CỒNG TỐT NGHIỆP CỨNG

1 Điểm 6 trụ năng lực ≥ 2.5 (không trụ nào = 0)

2 Hệ thống chạy được — demo trực tiếp, không chỉ tài liệu

3 Qua vấn đáp (viva) — hỏi sâu, chứng minh hiểu thật

Thiếu 1 trong 3 = chưa tốt nghiệp, dù tài liệu đẹp.

KPI TRỤ C → OUTCOME AIX

Nén giờ (giờ chuẩn ÷ giờ thật)

→ Margin ↑ (Trụ A)

Adoption AI vào quy trình

→ Năng lực Trụ A & B


Rework · bug rate ↓

→ Chất lượng giao hàng

Các sáng kiến AI — chọn 3-5 trọng tâm

A Trụ A · Delivery	B Trụ B · Khách hàng	C Trụ C · Con người
Coding assistant chuẩn hoá ▪ adoption % · uplift SP/MD	Catalog use-case theo domain ▪ # use-case · # KH tiếp cận	Training / chứng chỉ ▪ # người cert
Test-gen & test-review ▪ coverage ↑ · giờ QA ↓	Pipeline POC → Production ▪ % POC→prod · doanh thu AI	Cộng đồng champion ▪ tỷ lệ áp dụng thật
AI cho tài liệu / BA ▪ giờ soạn ↓ · onboarding ↓	Offering AI-native mới ▪ pipeline value · # deal AI	
PR / review assistant ▪ cycle time ↓ · defect ↓		

Cây KPI: sáng kiến → chỉ số leading → outcome

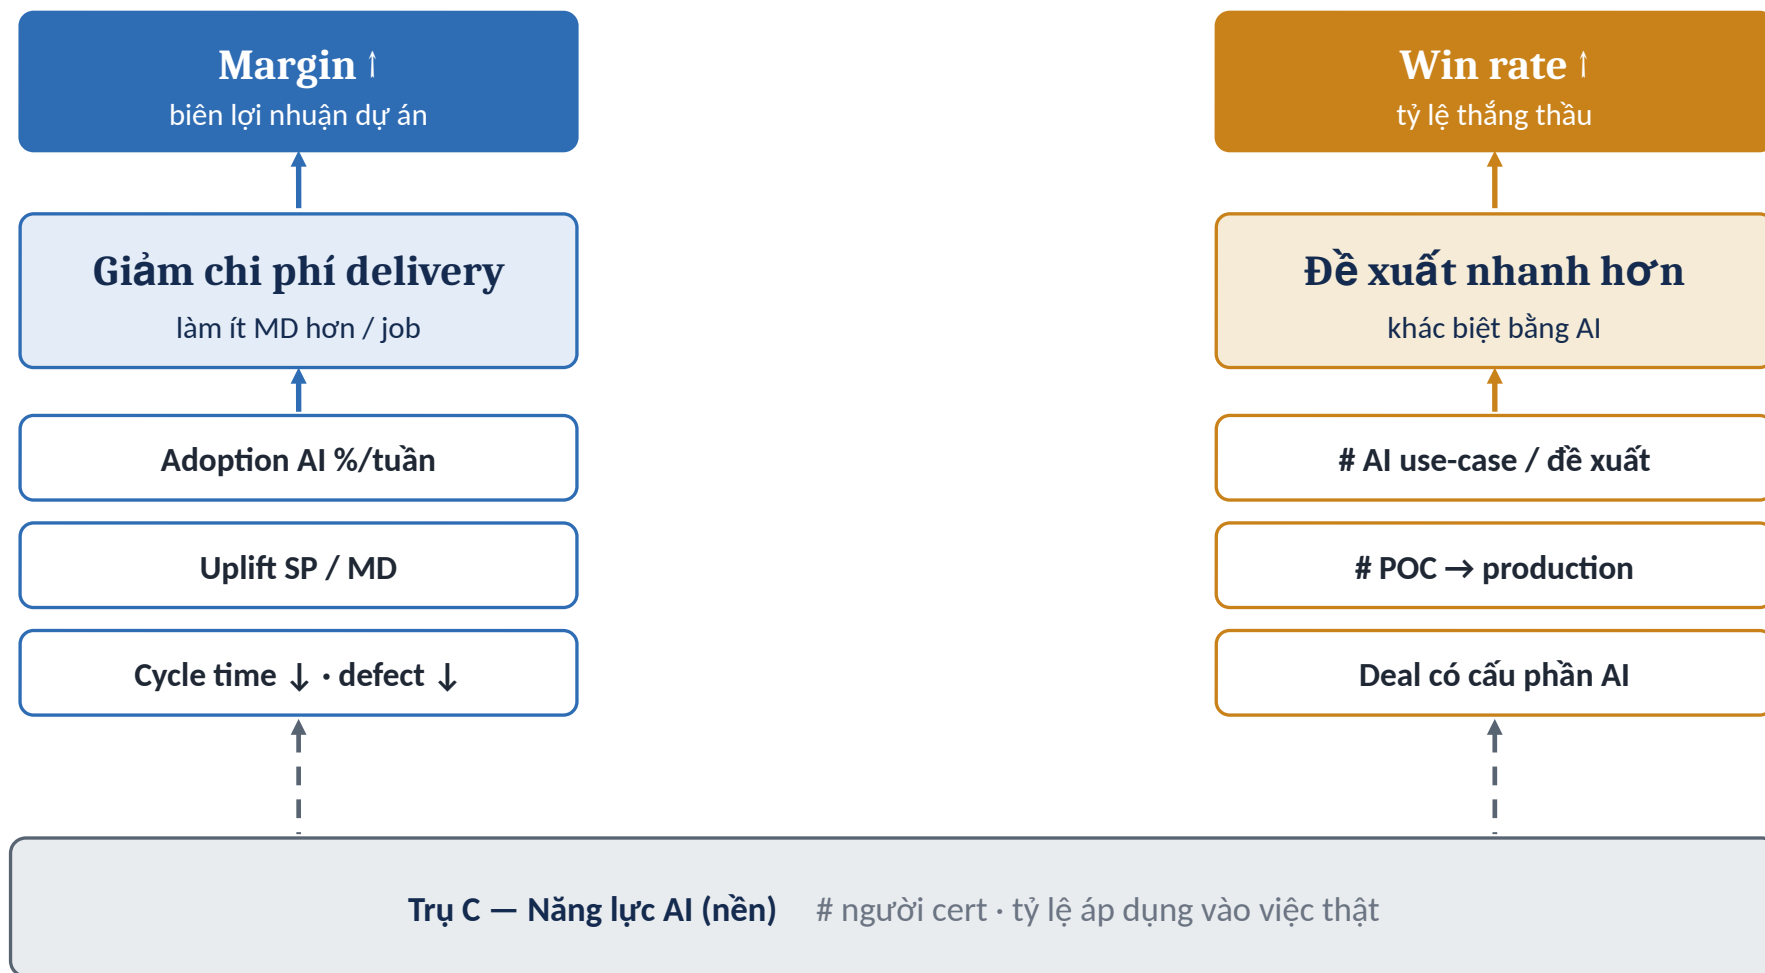

Margin & Win rate là chỉ số lagging — chuỗi leading (adoption, uplift, #use-case, #POC) là thứ lái được trong 6 tháng.

Q3 – Q4 2026 (≈ 6 tháng còn lại)

	Q3 · 7-9/2026	Q4 · 10-12/2026
A · Delivery	Chốt apply Pilot → chọn Pioneer, CarUX, WNC (↑ 20% margin) Chốt ODCx – HMotor, NS	Nhân rộng · đo uplift SP/MD · chuẩn hoá playbook Xây dựng được Offering cho mô hình ODCx – Outcome based (có thể ko toàn diện ODC mà một phần ODC)
B · Khách hàng	Tất cả các Offer cần áp dụng AI, tăng win rate (nếu được phép)	Tiếp tục công việc của Q3
C · Con người	Batch 1-5 Đo adoption sau training hiện tại	Batch 6-10 Đào tạo tiếp + cộng đồng champion
Governance	Ban hành policy tool/IP/security · dựng dashboard	Review giữa kỳ + báo cáo outcome cuối năm

Nguyên tắc: có report rõ ràng về tiến độ monthly - hiệu quả quartly

Mỗi sáng kiến khai đủ theo 6 Rõ

6 Rõ	Nội dung cần điền cho từng sáng kiến
1 • Bài toán lớn	Bài toán FA đang giải + lượng hoá đích (VD năng suất +25% / win rate +X điểm)
2 • Nhiệm vụ	Đầu việc & chỉ số theo tháng-tuần
3 • Thời hạn	Mốc Ngày/Tháng + tần suất review (VD báo cáo 2 tuần/lần)
4 • Kết quả đầu ra	Tiêu chí tính & cách đánh giá từng chỉ số
5 • Người phụ trách	Owner đủ thẩm quyền cho sáng kiến
6 • Ngân sách	Chi phí tool/license + nhân sự chuyên môn

2 điều quyết định độ tin của con số

1. Baseline + Attribution

- Margin & win rate bị chi phối bởi giá, đối thủ, mix dự án.
- Các tính hiệu quả cho AI: đo baseline → chạy pilot có nhóm đối chứng (dùng AI vs Est truyền thống) → chênh lệch = phần AI đóng góp.
- Không có baseline ⇒ cuối năm không chứng minh được.

2. Kỳ vọng thời gian

- 6 tháng: adoption, uplift SP/MD, #use-case, #Result có số thật.
- Margin & win rate thường chỉ ra tín hiệu sớm trên vài pilot.
- Mục tiêu Q4: chứng minh cơ chế + 1-2 case có số — chưa hứa dịch chuyển margin toàn bộ FA.

BƯỚC TIẾP THEO

Cần bổ sung để có Detailed Plan

1

FA + domain

Quy mô; sub-domain automotive nào (quyết định catalog use-case Trụ B).

2

Baseline hiện tại

Margin % và win rate FA đang ở đâu (áng chừng); MD/chi phí trung bình.

3

Pipeline Q3-Q4

Có deal/account nào sắp đấu thầu để làm pilot win rate không?

4

Ngân sách tool

License/tool được cấp tới đâu (điền Rõ ngân sách) — có thể sau.

Sau khi có 1-3: điền target vào từng ô cây KPI + xuất bảng 6 Rõ hoàn chỉnh cho 3-5 sáng kiến.

6 trụ năng lực tốt nghiệp (rubric 0–4)

Đây là 6 nhóm năng lực chấm ở Cổng 1: trung bình 6 trụ ≥ 2.5 và không trụ nào = 0 mới đạt.

C1

Hiểu & dùng AI

AI Literacy

Nắm khả năng & giới hạn của AI; biết ra lệnh (prompt) và đánh giá kết quả.

C2

Ủy quyền cho AI

AI Delegation

Giao việc cho AI đúng mức (thang L0–L5); cân rủi ro với việc AI làm được.

C3

Thiết kế luồng việc

Workflow Design

Chia & xếp việc người + AI thành quy trình chạy được từ đầu đến cuối.

C4

Quản trị & rủi ro

Governance & Risk

Có người kiểm soát; bảo mật; AI không tự push/merge, không đụng dữ liệu bí mật.

C5

Đo lường chỉ số AI

Telemetry & Economics

Đo năng suất bằng telemetry (giờ, token, Nén); quyết định theo chi phí/ROI.

C6

Dẫn dắt theo kết quả

Outcome Leadership

Lái đội người + AI về đích business (margin, win rate), không chỉ xong việc.

Glossary (1/2) — khái niệm & chỉ số

Thuật ngữ	Giải thích
AIX	AI Transformation — chuyển đổi ứng dụng AI cho đơn vị.
6 Rõ	Chuẩn FPT: rõ bài toán, nhiệm vụ, thời hạn, kết quả, người phụ trách, ngân sách.
Margin	Biên lợi nhuận của dự án — kết quả kinh doanh chính của Trụ A.
Win rate	Tỷ lệ thắng thầu/deal — kết quả kinh doanh chính của Trụ B.
Leading / Lagging	Chỉ số dẫn dắt (lái sớm được) vs chỉ số kết quả (đến sau).
Baseline	Mốc số liệu gốc trước khi áp dụng AI, để đo phần AI đóng góp.
Attribution	Cách quy phần kết quả thực sự do AI tạo ra (dùng nhóm đối chứng).
Adoption	Tỷ lệ người thực sự dùng AI đều đặn (VD %/tuần).
Nén	Giờ làm truyền thống ÷ giờ làm thật với AI — KPI năng suất cốt lõi của Trụ C.
Telemetry	Dữ liệu đo tự động (giờ, token, số lần sửa lại...) để chứng minh năng suất AI.
CASAN	Thang trưởng thành AI 5 cấp của FPT: Curious · Augmented · Standard · Automated · Native.
Pilot	Thử nghiệm có kiểm soát trên phạm vi nhỏ trước khi nhân rộng.
Playbook	Bộ quy trình/hướng dẫn chuẩn hoá để nhân rộng cách làm.
Capstone	Đồ án tốt nghiệp “Build your Customer Zero”: cặp người + AI dựng 1 hệ thống chạy được.
Viva	Buổi vấn đáp/bảo vệ: hỏi sâu để kiểm tra học viên thực sự hiểu, không duyệt cho qua.
Outcome	Kết quả kinh doanh cuối cùng (margin, win rate) mà sáng kiến nhắm tới.

Glossary (2/2) — từ viết tắt & tiếng Anh

Từ viết tắt	Giải thích
FA	Đơn vị được phụ trách AIX (điền tên/định nghĩa chính xác sau).
PM / BA / SA	Project Manager / Business Analyst / Solution Architect.
Dev	Developer — lập trình viên.
QA	Quality Assurance — kiểm thử / đảm bảo chất lượng.
PR	Pull Request — yêu cầu gộp code, để review trước khi nhập vào nhánh chính (merge).
KPI	Key Performance Indicator — chỉ số đo hiệu quả then chốt.
POC	Proof of Concept — bản chạy thử để chứng minh giá trị trước khi lên production.
SP / MD	Story Point (đơn vị khối lượng việc) / Man-Day (người-ngày).
Uplift SP/MD	Mức tăng năng suất: story point tạo ra trên mỗi man-day.
ODC / ODCx	Offshore Development Center / mô hình ODC theo kết quả (outcome-based).
Offering	Gói sản phẩm/dịch vụ mang đi bán cho khách hàng.
Delivery	Khâu thực thi & giao hàng dự án (Trụ A).
Governance	Quản trị: chính sách tool/bản quyền/bảo mật, cách đo & ngân sách.
Dashboard	Bảng theo dõi số liệu trực quan.
Domain	Lĩnh vực/ngành nghiệp vụ (VD sub-domain automotive).
Est	Estimate — ước lượng công sức/chi phí theo cách truyền thống (chưa dùng AI).
Batch	Đợt học viên tham gia đào tạo (VD Batch 1-5).
